

甘肃国邦信息科技有限公司

连续性分析报告

SXXDC-ITSS-15-03

拟制人：_____胡葛鹏宇

目 录

1. 测试概述.....	1
1.1 测试目的	1
1.2 测试范围	1
1.3 测试时间	1
1.4 参与人员	1
2. 测试场景与流程.....	1
2.1 测试场景	1
2.2 测试流程	2
3. 测试结果与分析.....	3
3.1 RTO/RPO 达成情况	3
3.2 主要发现	3
4. 结论与改进建议.....	4
4.1 测试结论	4
4.2 改进建议	4

1. 测试概述

1.1 测试目的

为验证《服务连续性计划》的有效性与可行性，检验公司在遭遇重大服务中断时，技术恢复团队能否按照既定策略和流程，在规定的恢复时间目标（RTO）与恢复点目标（RPO）内恢复核心业务服务。

1.2 测试范围

本次测试涵盖以下核心业务服务：

统一支付中台（dream-pay）

用户中心（dream-user）

梦网网关（dream-gateway）

1.3 测试时间

测试准备： 2025 年 9 月 20 日

测试执行： 2025 年 9 月 21 日 09:00 - 14:00

测试总结： 2025 年 9 月 22 日

1.4 参与人员

角色	人员	部门
测试总负责人	胡葛鹏宇	运维部
技术恢复执行	运维部团队	运维部
研发支持	游天舒及研发成员	研发部
过程记录与评估	金文莉	质量部


2. 测试场景与流程


2.1 测试场景

模拟生产机房区域性网络故障，导致主节点数据库（MySQL）及核心应用服务不可用，触发服务连续性计划。

2.2 测试流程

测试团队严格遵循以下恢复流程，并在关键节点记录时间与操作结果：

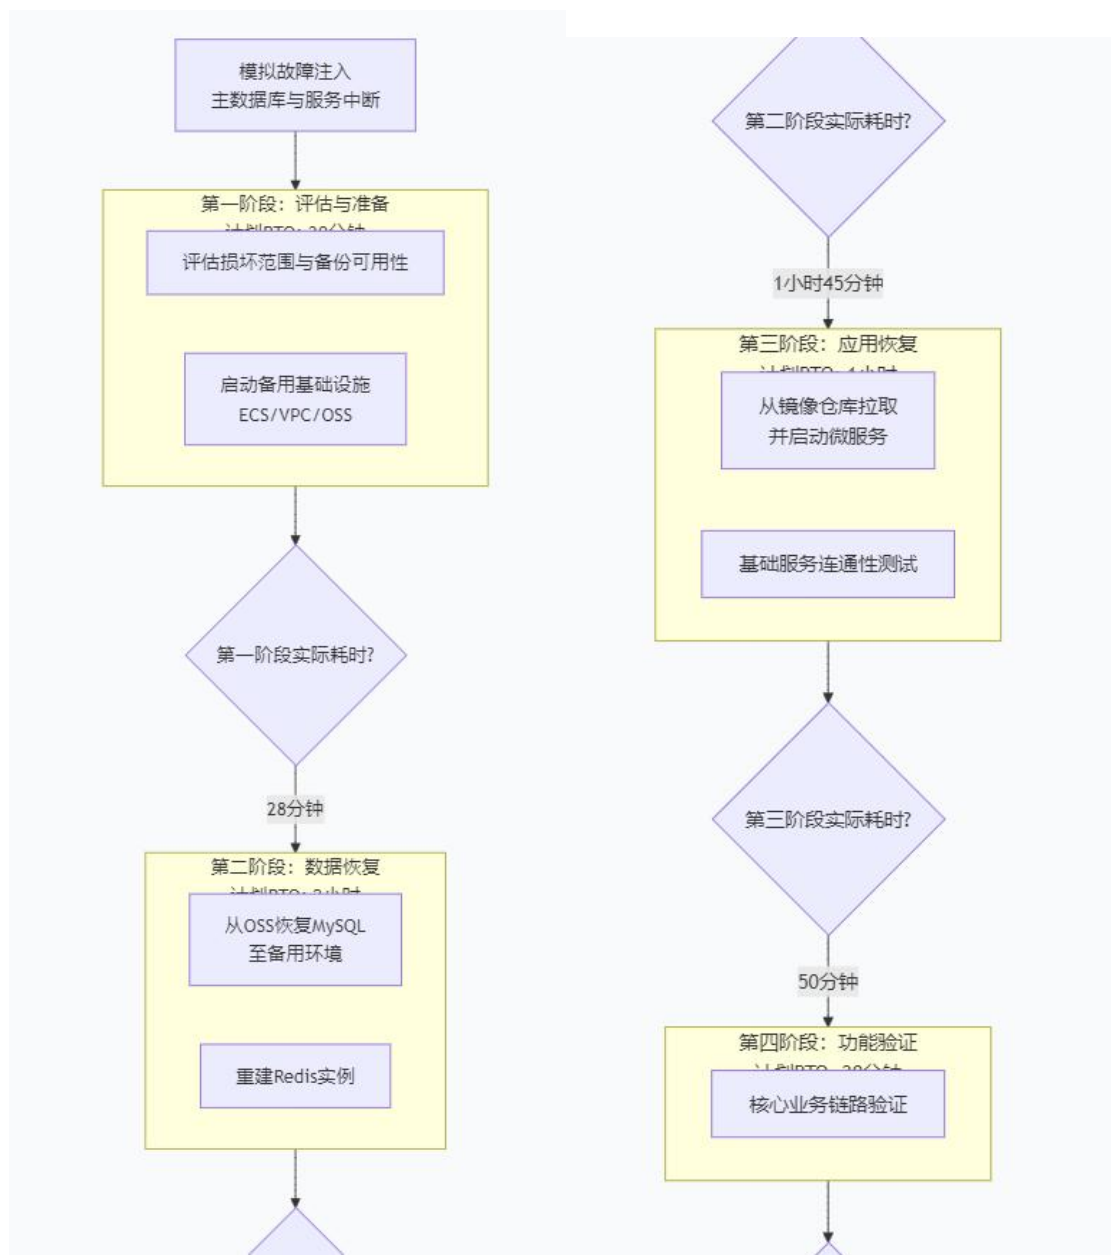

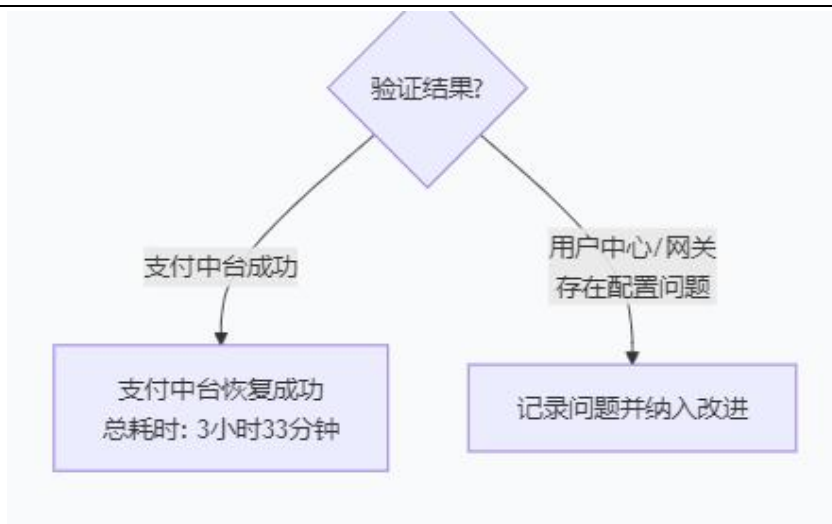

3. 测试结果与分析

3.1 RTO/RPO 达成情况

关键服务	RTO 目标	实际 RTO	RPO 目标	实际 RPO	是否达标
统一支付中台	4 小时	3 小时 33 分钟	15 分钟	15 分钟	是
用户中心	4 小时	4 小时 18 分钟	1 小时	1 小时	部分达标
梦网网关	4 小时	4 小时 25 分钟	1 小时	1 小时	部分达标

3.2 主要发现

成功之处：

备份恢复机制有效，数据库 RPO 完全达标。

支付中台的恢复流程顺畅，展现了良好的应急能力。

团队协作沟通顺畅，应急指挥结构清晰。

待改进点：

用户中心与网关恢复延迟：因备用环境个别配置文件版本与生产环境不一致，导致服务启动后出现兼容性问题，排查耗费额外时间。

文档细节缺失：《关键系统恢复操作手册》中缺少对备用环境特定配置的说明。

4. 结论与改进建议

4.1 测试结论

本次测试证明，《服务连续性计划》的整体策略和流程基本有效，核心支付业务能在要求的 RTO/RPO 内恢复。同时，测试也暴露出在配置管理和恢复文档细节方面存在不足，影响了部分服务的恢复效率。

4.2 改进建议

【高】配置管理强化：将备用环境的特定配置纳入配置管理数据库（CMDB）严格管控，确保与生产环境的一致性。责任部门：运维部；完成时限：2025-12-31。

【中】恢复手册更新：更新《关键系统恢复操作手册》，增加备用环境初始化及配置检查清单。责任部门：运维部；完成时限：2025-12-20。

【中】增加演练频率：建议明年增加针对特定中间件或应用的专项恢复演练，提升熟练度。责任部门：质量部、运维部；纳入 2026 年度计划。
